

ORTSBEIRATSSTEUERUNGSMITTEL - OSI



NR.	Art der Tätigkeit	Kurzbeschreibung	Status	Amt/Abteilung	Bearbeitungszeitraum	Bearbeitung	Ausführung	Bemerkung	Stand	Tätigkeitsstand	Bilder/Protokolle
1	<i>kurzfristige Maßnahme (Eilige)</i>	In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge, Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.	offen	Bauhof	2.HJ 2018	Mark Lotz	Stadt/Eigenleistung	Status 15.3.2018: Standort und Ausführung mit Bauhofleitung in einem noch festzulegenden Ortstermin mit Bauhof abzustimmen. Wunsch: analog "Begrüungsschildern" mit profilierten Kanthölzern und Schutzdach. Eigenleistungsmöglichkeit bei Aufstellung ist abzustimmen. Bauhof wartet auf Zeichnung laut Rücksprache L. und M. Mündlich. Analog der Ausführung in Hohenzell/Niederzell; Status 15.3.2018: Eckwerte für die Angebotserstellung auf Anfrage von Fa. Teamdruck von OV Wunderlich an Fa. Teamdruck geliefert, Abwicklung über OB-Budget.	Mrz 18	in Bearbeitung	
2	Ortsbeirats-Budget	Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz (Stirnseite Anwesen Eberhardt)	genehmigt	Bauhof	1.HJ 2018	Mark Lotz	Eigenleistung		Mrz 18	in Bearbeitung	
3	<i>langfristige Maßnahme</i>	Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich	offen	Bauhof	2.HJ 2018	Mark Lotz	Stadt	geprüft 2018-03-15. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 abgefragt und am 24.8.2016 an die Stadt per Ortsbeiratsprotokoll gemeldet. Der OBR. Geht davon aus, dass die Budgetierung nicht über das neue Ortsbeiratsbudget (3.000 € für HHJ 2018) erfolgt. Bitte um Bekanntgabe der zwei schätztesten Bänke. Diese Die Bereitschaft zur Eigenleistung und ggf. Spendenbereitschaft ist vorhanden io, Abwicklung über OB-Budget	Mrz 18	in Bearbeitung	
4	Ortsbeirats-Budget	Hangrutsche am Sportplatz	genehmigt	Bauamt	2.HJ 2018	Mark Lotz	Eigenleistung		Mrz 18	in Bearbeitung	
5	<i>Projekt</i>	Straßensanierung KIP-Programm: Verbindungsweg L3180/Mühlengrund	genehmigt	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
6	<i>Projekt</i>	Straßensanierung KIP-Programm: Bornkressweg und Mühlengrund Querrisse, Bordsteine und Wasserabstellerniveau	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
7	<i>Projekt</i>	Straßensanierung KIP-Programm: Hinter den Höfen (Schlagloch)	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
8	<i>Projekt</i>	Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
9	<i>Projekt</i>	Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkressweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott); Bornkressweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
10	<i>Projekt</i>	Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkressweg-Querrisse	offen	Bauamt	2.HJ 2019	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
11	<i>Projekt</i>	Behhebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden; Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen	offen	Bauamt	2.HJ 2020	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	
12	<i>Projekt</i>	Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umlenkung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt; Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel	offen					Übernahme in KIP Programm; Mühlengrund		unbearbeitet	
13	<i>Projekt</i>	Großflächige brüchige Toterdecke, Setzungen und Schlaglöcher im Wirtschaftsweg "Auf der Maas" zwischen Mühlengrund und L3180; Feldweg zwischen L3180 und Mühlengrund	genehmigt			Mark Lotz		erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	

14	Projekt	Großflächige Abbruchstellen der Teerdecke des Wirtschaftsweges gegenüber dem unbefestigten Panoramaweg im Einmündungsbereich Grauer Stuhl/Verlängerung Pfingstschüsselweg; Wirtschaftsweg Grauer Stuhl	genehmigt			Mark Lotz		erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen			
15	Projekt	Ausschilderung des Spiel- und Erlebnisbereiches am Sportplatz (Kopplung mit Ausschilderung Sportplatz (Ergänzung Piktogramm Fußball));	offen	Ordnungsamt		Tanja Mittag		Status 15.3.2018: Restarbeiten nötig, teilweise erledigt. OV erstellt Liste für Bauhof.		in Bearbeitung			
16	Projekt	Ausschilderung ab dem Dorfplatz zum DGH/FGH. Die Beschilderung sollte jedoch den Anlagencharakter nicht stören; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen			
17	Projekt	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren; Einmündung Feldweg vom Mühlgrund in L3180	offen					Restarbeiten nötig, Baum in Eigenleistung erledigt, Bank und Findling fehlt		unbearbeitet			
18	Projekt	Dachrinne undicht.Entwässert auf Privatgrundstück; Holz-Buswarthäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	offen					keine Rückmeldung vorhanden		unbearbeitet			
19	Projekt	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt; Kressenbachverrohrung	offen					Überprüfung der Notwendigkeit sollte zeitnah überprüft werden und in das Arbeitsprogramm des Bauhofes ausgenommen werden; Freiheit des Einlaufs von Treibgut ist ebenfalls zu prüfen; noch offen		unbearbeitet			
20	Projekt	Durchlass um 1,00m verlängern; Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr	offen					offen; Herr Heil will sich an den nKosten beteiligen OBR 9.10.2015; Punkt 23 der Anlage zum Protokoll (Maßnahmenliste Infrastruktur Stand 9.10.2015)		unbearbeitet			
21	Projekt	Setzungen und Ablösungen der Teerdecke im Bereich des Kabelgrabens Bornkresseweg/Zum Buchwasser (Richtung Sportplatz);	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen			
22	Projekt	Wanderwegnetz mit Infotafeln	offen					Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegnetz in Walroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet			
23	Projekt	Wanderwegnetz mit Schutzhütte	offen					Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegnetz in Walroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet			
24	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegnetz mit Anbindung nach Breitenbach; Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden	offen					Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegnetz in Walroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet			
25	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegnetz mit Anbindung nach Walroth; Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden	offen					Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegnetz in Walroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet			
26	Projekt	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern im mittleren Bereich des Fliederwegs (Höhe Anwesen Staaf);	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen			
27	Projekt	Dach aus Bitumenwellpappe ist verwittert, Dacherneuerung Holz-Buswarthäuschen im Bornkresseweg (Kirchgarten)	genehmigt					erledigt in Eigenleistung	Feb 18	abgeschlossen			
28	Projekt	Hydrant zu hoch – Schneepflug; Im Gern vor Anwesen Leopold, Winfried; Wunderlich-Hydrant	offen					offen		unbearbeitet			
29	Projekt	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007; Backhaussanierung	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			

30	Projekt	Ausweichplatz für Jugendliche und Training; Ballspielplatz	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			
31	Projekt	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden, Bepflanzung Fliederweg vor Anwesen Ostreich	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			
32	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
33	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant; Bornkresseweg vor S.Weis	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
34	Projekt	Qellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung Stall in Höhe der 1. Fangeneinrichtung im Kressenbach; Flutgrabensanierung	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
35	Projekt	Einzaunung und Torbereich erneuern; Friedhofzaun	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
36	Projekt	Alter Gesschirrpüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung im DGH	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			
37	Projekt	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			
38	Projekt	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist, Kurve Feldweg Kalte Buche	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
39	Projekt	Wellige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden; Oberfläche Sportplatz	offen					kontinuierliche Prüfung durch 1. FC K		in Bearbeitung			
40	Projekt	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial; Schrank für DGH	genehmigt					erledigt DE	Feb 18	abgeschlossen			
41	Projekt	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pfingstschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt werden. Schutzhütte Panoramaweg	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
42	Projekt	für Mehlschwalben; Schwalbenhaus	genehmigt					wird vom OB nicht weiter verfolgt; erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
43	Projekt	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen; Spielgeräte am Sportplatz	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen			
44	Projekt	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortsseingang, Gehweg; Straßenlampe Ortsseingang aus Richtung Breitenbach	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
45	Projekt	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg, Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage. Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidmühle	abgelehnt					Versetzung bis vor Wirtschaftsweg von Ordnungsamt und Polizei abgelehnt, wäre zu weit außerhalb Bebauung	Feb 18	abgeschlossen			
46	Projekt	Ausbessern des Fahrbahnbelages; Zum Sportplatz-Wasserrohrbruch	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen			
47	Projekt	Großflächige brüchige Teerdecke und Setzungen im Bereich des Fliederwegs in Höhe des Abzweigs Mühlengrund (Höhe Anwesen Eckhardt und Anwesen Ostreich), Fliederweg vor Anwesen Eckhardt/Ostreich	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen			
48	Projekt	Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl	offen					Neuaufnahme 2018-03-15; Standardstrecke landwirtschaftlicher Verkehr, Ortsbeiratssitzung vom 15.3.2018		unbearbeitet			

49	Projekt	Einbringen von Bodenestrich mit Dämmung auf der Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH	offen					Begründung: Die fehlende Deckenwärmedämmung, OBR Sitzung vom 24.8.2017	unbearbeitet			
50	Projekt	Wetterschutz für die Eingangsbereiche des DGH	offen					Beide Eingangsbereiche sind ohne wirksame Überdachung als Schutz vor Regen/Schneefall ausgeführt, E-Mail vom 18.12.2017 + OBR Sitzung 8.2.2018	unbearbeitet			
51	Projekt	Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof	offen					Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	unbearbeitet			
52	Projekt	Freischneiden und Herstellung Begehrbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach	offen					Anbindung und Ausschliederung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	unbearbeitet			
53	Projekt	Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern	offen					Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Bosgesrain“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Waltherhof/L3180 herzustellen, Realisierung eventuell über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	unbearbeitet			
54	kurzfristige Maßnahme (Eilig)	Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunnens am Dorfplatz	offen					Abfluss vollständig verstopft. Kamerabefahrung und Versuch des Freifräsens im Sommer 2017 erfolgt. Bitte Abstimmung der Reparaturarbeiten mit Kirchturmsanierung durch Kirchengemeinde W-B-K, E-Mail 17.12.2017 + OBR Sitzung vom 24.8.2017	unbearbeitet			
55	Projekt	Reparatur Sockelleisten DGH	offen					Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lösen sich die Sockelleisten von der Wand, OBR Sitzung v. 24.8.2017	unbearbeitet			
56	Projekt	Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH	offen					Fußboden stark abgestumpft, OBR Sitzung v. 24.8.2017	unbearbeitet			
57	Projekt	Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen	offen					Außenbereich DGH, OBR Sitzung v. 24.8.2017	unbearbeitet			
58	Projekt	Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen	offen					OBR Sitzung v. 24.8.2017	unbearbeitet			
59	Projekt	Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzszahlungen (WKA)	offen					Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Buche (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden, OBR Sitzung v. 24.8.2017	unbearbeitet			

60	Projekt	Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	offen				(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Flutgrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde), OBR	unbearbeitet			
61	Projekt	Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts	offen				Durch Erdaushubanlieferung durch 4-Achs-Lkws wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzweigende unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet, OBR Sitzung v. 8.2.2018	unbearbeitet			
62	Projekt	Vollständige Beseitigung Erdaushubreste am Weinberg an der Weggabelung „Am neuen Weg“/„Bundes“	offen				An dieser Stelle ist die Aufstellung einer Ruhebänk vorgesehen. Der dort gelagerte Erdaushub wurde grob beseitigt. Der Boden ist allerdings nicht wieder in den Urzustand versetzt, sodass beim Aufstellen der vorgesehenen Ruhebänk an dieser Stelle zusätzliche Reinigungsarbeiten durch die freiwilligen Helfer oder den Bauhof nötig werden. Die Stadtverwaltung wird darum gebeten, beim Eigentümer des angrenzenden Wiesengrundstückes für das der Aushub verwendet wurde, darauf hinzuwirken, dass auch die restlichen Aushub-Rückstände von dem öffentlichen Bereich vor dem Wiesengrundstück entfernt werden, OBR Sitzung v. 15.3.2018	unbearbeitet			

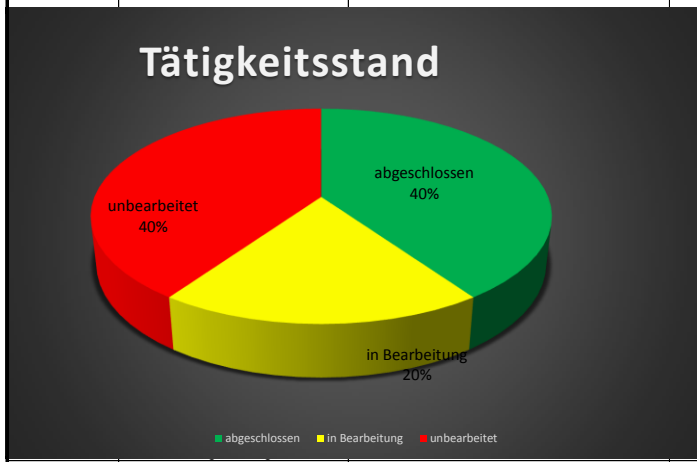

Vorhandenes Ortsbeirats-Budget 2018:				3.000,00 €
Nummer	Vorhaben	Anmeldedatum	Betrag	Ausgezahlt am
2018/1				
2018/2				
2018/3				
2018/4				
2018/5				
2018/6				
2018/7				
2018/8				

